

Kế Hoạch Hành Động

📈 **NET REVENUE +15% ~ +20%**

Chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu, in-house app (Local AI) & tối ưu hóa doanh thu thực nhận sau khi khấu trừ chi phí sàn OTA.




⚡ 100% In-House LAN

🤖 Local AI Qwen2.5-3B

📊 BI Dashboard Quản Trị

Đơn vị thực hiện: **Công ty TNHH SonDoong Labs**

Báo cáo: **Ban Giám Đốc Khách Sạn A26**

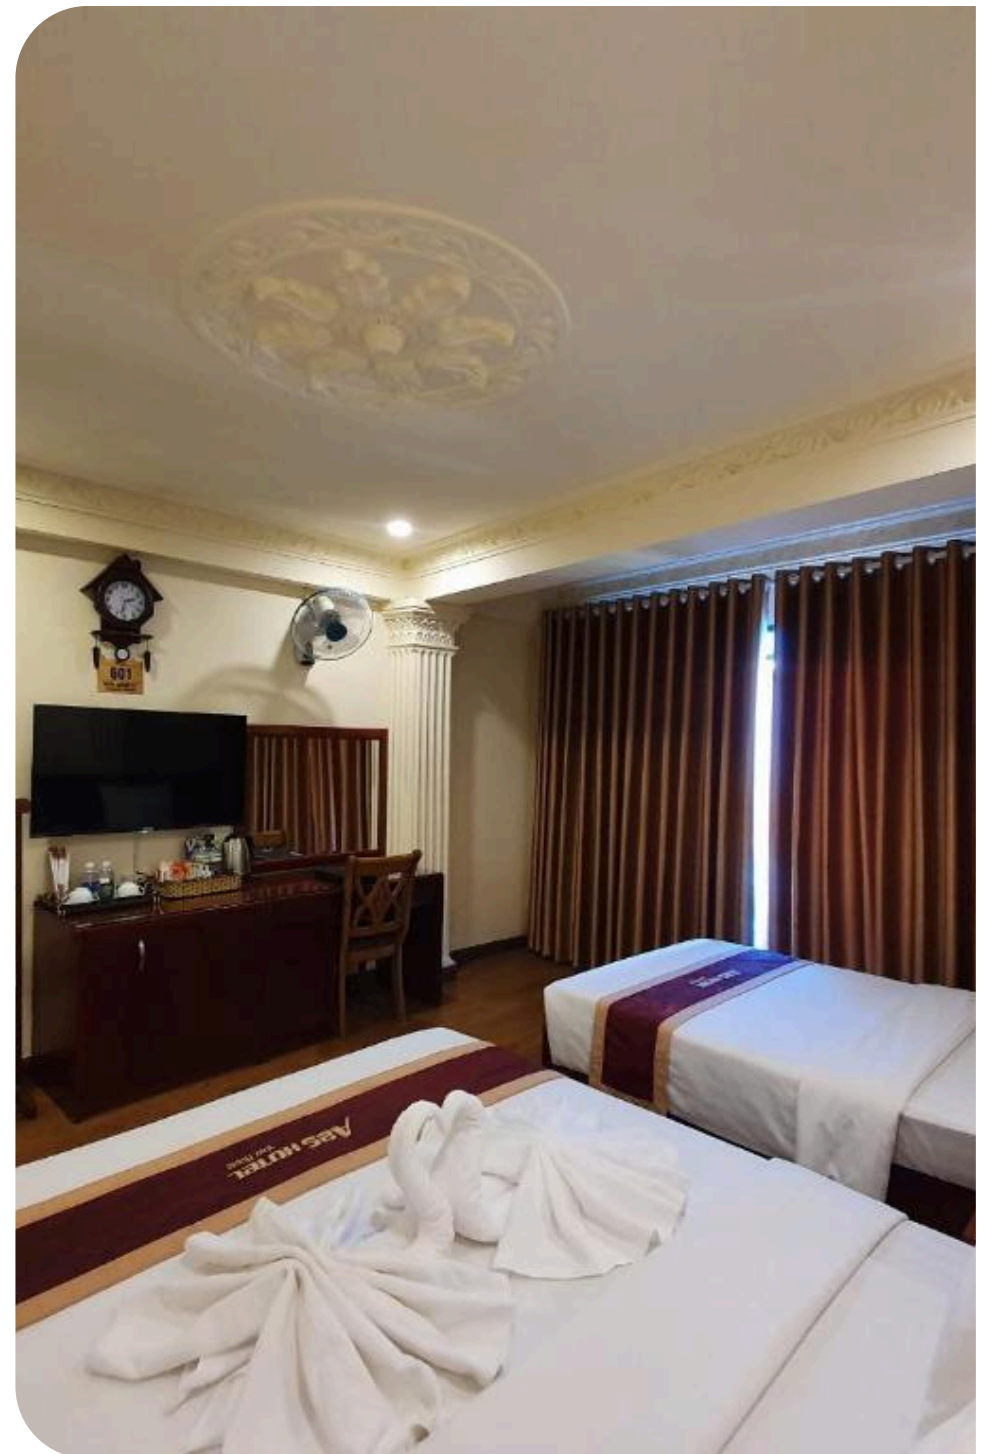



BỐI CẢNH

- Nhân viên & lễ tân luôn hoàn thành tốt KPI và nhiệm vụ.
- Doanh thu và lợi nhuận thực tế không tăng trưởng như kỳ vọng.



MỤC TIÊU BẮT BUỘC TRONG 7 TUẦN

TĂNG TRƯỞNG



+15% đến +20%

Net Revenue (thực nhận sau phí sàn)
so với mốc baseline tháng trước



5 HẠNG MỤC CỐT LÕI TRONG 7 TUẦN

1



Rà soát & làm sạch dữ liệu

Rà soát và làm sạch dữ liệu sổ sách, file Excel tháng trước để tạo bảng dữ liệu chuẩn và đề xuất gói giải pháp.

2



Web App nội bộ

Xây dựng Web App phục vụ nhập đơn và tra cứu phòng cho lễ tân.

3



Tích hợp AI cục bộ

Tích hợp AI (Local AI) để bóc tách thông tin từ voucher các sàn OTA.

4



BI Dashboard quản trị

Xây dựng BI Dashboard theo dõi doanh thu thực nhận và các chỉ số vận hành.

5



Kịch bản bán hàng

Soạn thảo và huấn luyện kịch bản bán phòng trực tiếp và nâng hạng phòng tại quầy.

POST-MVP (GIAI ĐOẠN SAU)



Tự động
đổi giá phòng



Kết nối API
trực tiếp với các sàn



Ứng dụng
di động




Quản lý
buồng phòng



Quản lý
bảo trì

Các tính năng mở rộng sẽ được xem xét triển khai ở giai đoạn sau (Post-MVP).

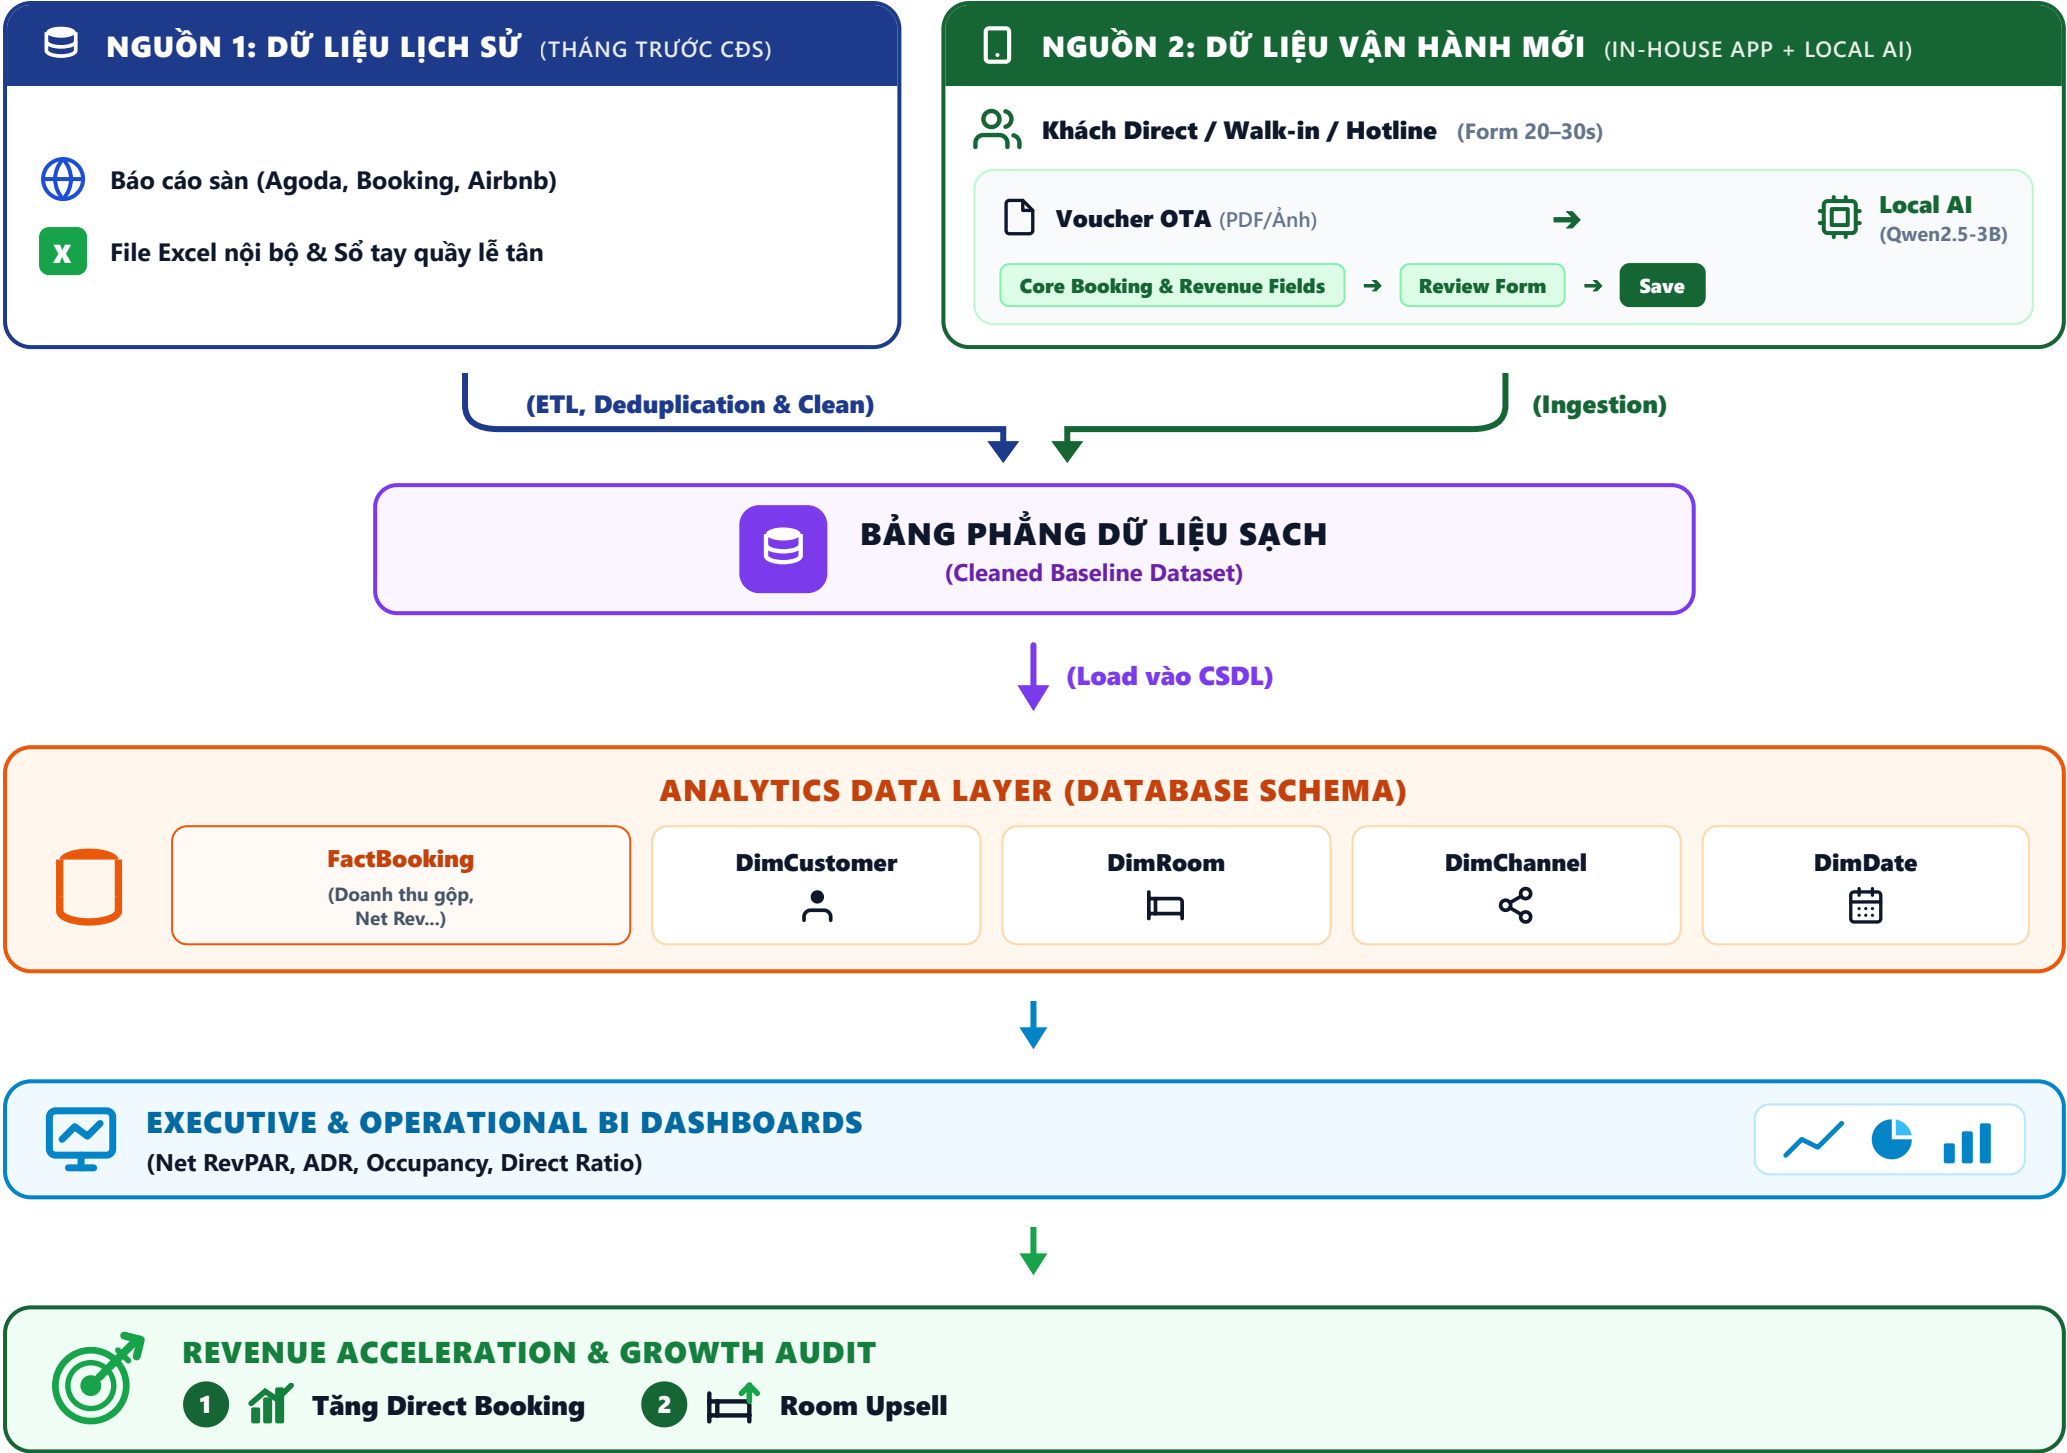

PHASE 1: GOM DỮ LIỆU VỀ 1 NGUỒN & CHẨN ĐOÁN LỖ HỒNG (TUẦN 1 – TUẦN 2)

TUẦN 1

Thu thập dữ liệu thô, khảo sát hiện trạng & thống nhất quy chuẩn



VẬN HÀNH

Lễ tân tiếp tục ghi sổ bình thường; đội dự án thu thập sổ sách cũ và báo cáo từ các sàn.



MỤC TIÊU

Kiểm kê nguồn tài liệu thô tháng trước, khảo sát lỗi ghi chép và chốt quy chuẩn vận hành chung.

NỘI DUNG THỰC HIỆN

1 Thu thập dữ liệu

Báo cáo sàn (Agoda, Booking), file Excel nội bộ và ảnh chụp sổ tay lễ tân.



2 Rà soát lỗi phổ biến

Thiếu CCCD/SĐT khách, viết tắt tên phòng không đồng nhất, nhầm ngày nhận/trả...



3 Thống nhất quy chuẩn

Danh mục chuẩn & công thức cốt lõi:
Tiền thực nhận = Tiền khách trả - Hoa hồng sàn.



TUẦN 2

Xử lý dữ liệu, tạo bảng phẳng (Flatten Table) & báo cáo chẩn đoán doanh thu và đề xuất gói giải pháp



VẬN HÀNH

Khách sạn nhận gói khuyến nghị kinh doanh (Quick-Wins) để áp dụng ngay từ Tuần 3.



MỤC TIÊU

Gộp toàn bộ dữ liệu lịch sử thành 1 bảng phẳng duy nhất (Cleaned Baseline Dataset), chuẩn hóa các trường và xuất báo cáo chẩn đoán doanh thu.

NỘI DUNG THỰC HIỆN (4 BƯỚC XỬ LÝ)

1 Chuẩn hóa dữ liệu



Định dạng ngày, tiền, SĐT, danh mục phòng & kênh



2 Làm sạch & dedup



Loại bỏ trùng lặp, đơn test, sai lệch thông tin



3 Tính tiền thực nhận



Net Revenue = Khách trả - Phí hoa hồng sàn



4 Bảng phẳng & Chẩn đoán



Bảng sạch 100% đơn & Báo cáo chẩn đoán baseline

KẾT QUẢ BÁO CÁO KHÁCH HÀNG (PHASE 1)



Tuần 1: Khảo Sát & Quy Chuẩn

- Báo cáo thực trạng: tỷ lệ thiếu thông tin & đơn lệch tiền.
- Bảng quy chuẩn danh mục & công thức tính tiền đã chốt.



Tuần 2: Bảng Phẳng & Chẩn Đoán

- Bảng phẳng sạch hoàn chỉnh: 100% đơn chuẩn hóa.
- Báo cáo chẩn đoán: số tiền hoa hồng mất & gói Quick-Wins.



SẢN PHẨM BÀN GIAO (PHASE 1)

- D-01: Báo cáo khảo sát hiện trạng sổ sách & bảng quy chuẩn
- D-02: Bảng phẳng dữ liệu sạch (Cleaned Baseline Dataset)
- D-03: Báo cáo chẩn đoán doanh thu & gói khuyến nghị tức thì

PHASE 2: CHUYỂN ĐỔI SỐ VẬN HÀNH & CẮT BỎ SỔ TAY (TUẦN 3 – TUẦN 5)

TUẦN 3

Dựng CSDL Star Schema & Web App Nội Bộ (Form 20–30s)



VẬN HÀNH

Áp dụng khuyến nghị Tuần 2; trải nghiệm thử giao diện Web App nội bộ trên mạng LAN.



MỤC TIÊU

Khởi tạo CSDL Star Schema & dựng Web App LAN gồm form nhập nhanh và tra cứu phòng.

NỘI DUNG THỰC HIỆN (TUẦN 3)

- CSDL Star Schema:** Thiết kế FactBooking + 4 Dim, nạp baseline sạch làm nguồn chuẩn.
- Web App FastAPI LAN:** Form nhập khách quầy 20–30s có chặn lỗi (bắt buộc SĐT, tiền, ngày nhận/trả).
- Tra Cứu & Phân Quyền:** Tìm kiếm tên/SĐT, lọc đơn check-in/out theo ca trực, phân quyền Chủ & Lễ tân.

TUẦN 4

Tích Hợp Local AI Đọc Vé & Chạy Thử Song Song (3–5 Ngày)



VẬN HÀNH (CHẠY THỬ)

Lễ tân vừa ghi sổ vừa nhập trên App 3–5 ngày để quen tay và đối soát khớp tiền.



MỤC TIÊU

Cài đặt Local AI đọc vé (≤10s, Acc ≥95%), đào tạo SOP và hoàn tất chạy thử an toàn.

NỘI DUNG THỰC HIỆN (TUẦN 4)

- Local AI Qwen2.5-3B:** Bóc tách voucher Agoda/Booking; chặn trùng mã; xác nhận ≤10s/vé.
- Kiểm Thử UAT 30–50 Vé:** Test trực tiếp trên vé thật của khách sạn đảm bảo độ chính xác ≥95%.
- Huấn Luyện SOP 1 Trang:** Hướng dẫn lễ tân quy trình chuẩn; đối soát ca trực khớp 100% sổ tay.

TUẦN 5

Go-Live 100% Cắt Sổ Tay, BI Dashboard & Kịch Bản Bán Phòng



VẬN HÀNH (GO-LIVE)

Chấm dứt 100% sổ tay; 100% đơn qua App & AI; chủ xem BI; lễ tân áp dụng kịch bản bán.



MỤC TIÊU

Go-Live 100% không sổ tay, triển khai BI Dashboard và trang bị bộ kịch bản bán phòng.

NỘI DUNG THỰC HIỆN (TUẦN 5)

- Go-Live 100% Cắt Sổ:** Chấm dứt hoàn toàn ghi chép sổ tay; toàn bộ đơn lưu trực tiếp vào CSDL.
- BI Dashboard Quản Trị:** Theo dõi tự động Net Revenue, Net RevPAR, ADR, Occ% & tỷ trọng kênh.
- Kịch Bản Direct & Upsell:** Bán trực tiếp giữ 100% tiền phòng & nâng hạng Standard → Deluxe.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC & BÁO CÁO KHÁCH HÀNG (PHASE 2)

Tuần 3: CSDL & App Core

- CSDL tập trung hoàn chỉnh & bảo mật LAN.
- Chủ & lễ tân trải nghiệm nhập phòng thành công.

Tuần 4: AI & UAT 3–5 Ngày

- Lễ tân thành thạo App & AI đọc vé ≤10s.
- Số liệu test song song khớp 100% sổ tay.

Tuần 5: Go-Live & Dashboard

- Cắt bỏ sổ tay hoàn toàn, 100% số hóa.
- Chủ xem BI & duyệt kịch bản bán phòng.

SẢN PHẨM BÀN GIAO (PHASE 2)



- D-04 & D-05:** CSDL Star Schema & Web App nội bộ (LAN Core)
- D-06 & D-07:** Module Local AI đọc vé & SOP lễ tân (Biên bản UAT)
- D-08, D-09, D-10:** Biên bản Go-Live 100%, BI Dashboard & Kịch bản bán

PHASE 3: GIÁM SÁT VẬN HÀNH & BÀN GIAO NGHIỆM THU (TUẦN 6 – TUẦN 7)

TUẦN 6

Giám Sát Vận Hành & Hỗ Trợ Kỹ Thuật Sau Go-Live (Post-GoLive Support)



VẬN HÀNH (TÚC TRỰC HỖ TRỢ)

Khách sạn vận hành 100% trên phần mềm mới; đội dự án túc trực hỗ trợ giải đáp và xử lý phát sinh mọi ca trực.



MỤC TIÊU

Đảm bảo hệ thống Web App và Local AI chạy ổn định trong môi trường thực tế, lễ tân thao tác trơn tru và xử lý lỗi kịp thời.

NỘI DUNG THỰC HIỆN (TUẦN 6)

1 Túc Trực Hỗ Trợ

Hỗ trợ nhân viên lễ tân xử lý các tình huống thực tế (mẫu vé sà n mới, điều chỉnh đơn phòng linh hoạt).



2 Tối Ưu & Vá Lỗi

Khắc phục nhanh các lỗi giao diện/logic nhỏ phát sinh; tối ưu tốc độ đọc vé của Local AI ($\leq 10s/vé$).



3 Rà Soát CSDL

Rà soát đảm bảo 100% đơn phòng trong tuần được lưu đầy đủ vào CSDL tập trung và hiển thị chuẩn trên BI Dashboard.



TUẦN 7

Tổng Kết Báo Cáo Doanh Thu & Bàn Giao Nghiệm Thu Toàn Diện Dự Án



VẬN HÀNH (NGHIỆM THU)

Hệ thống chạy hoàn toàn ổn định; chủ khách sạn nghiệm thu kết quả tăng trưởng thực tế và nhận bàn giao toàn diện.



MỤC TIÊU

Cài đặt sao lưu dữ liệu tự động, xuất báo cáo tổng kết doanh thu và bàn giao nghiệm thu dự án.

NỘI DUNG THỰC HIỆN (TUẦN 7)

1 Tự Động Sao Lưu

Cài đặt script tự động sao lưu CSDL hàng ngày sang ổ cứng phụ / thiết bị an toàn để chống rủi ro mất dữ liệu.



2 Tổng Kết Doanh Thu

Đối chiếu số liệu Dashboard với baseline; chứng minh tăng trưởng **+15% ~ +20% Net Revenue** và giảm phí sà n.



3 Bàn Giao & Ký Kết

Bàn giao tài liệu hướng dẫn vận hành SOP, tài khoản quản trị và ký biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án.



KẾT QUẢ BÁO CÁO KHÁCH HÀNG & NGHIỆM THU (PHASE 3)



Tuần 6: Ổn Định Vận Hành 100%

- 100% đơn nhập qua App & AI khớp số liệu, không sót đơn.
- Xử lý triệt để phát sinh, hệ thống vận hành mượt mà.



Tuần 7: Tăng Trưởng +15% ~ +20%

- Báo cáo tổng kết chứng minh tăng trưởng Net Revenue.
- Ký biên bản nghiệm thu & bàn giao toàn diện dự án.



SẢN PHẨM BÀN GIAO (PHASE 3)

- D-11: Báo cáo giám sát vận hành & ổn định hệ thống Tuần 6
- D-12: Báo cáo tổng kết doanh thu & đánh giá hiệu quả dự án
- D-13: Biên bản nghiệm thu bàn giao toàn diện & Auto-Backup
